工事進捗状況（平成 25 年 5 月現在）

◇ 主な工事の進捗率 ◇

高度浄水中間ポンプ施設築造及び場内連絡管布設工事　58%
高度浄水オゾン処理施設及び生物活性炭施設築造工事　76%

主要工事	H22	H23	H24	H25	H26	H27
施設建設用地造成工事	造成					
中間ポンプ施設築造及び場内連絡管布設工事		基礎工	築造 連絡管布設	築造 連絡管布設		
オゾン処理施設及び生物活性炭施設築造工事		基礎工	築造	築造		
電気設備・機械設備工事			機器設計製作	機器製作 据付調整		
試運転調整等					⇨通水	

◇ 現場の状況 ◇

＜中間ポンプ棟＞

中間ポンプ棟は、床面コンクリート工事が終わり、中間ポンプのヘッダー管（口径 2,400mm）を設置しました。

また、ポンプ井側では壁を立ち上げているところです。（右写真奥側）

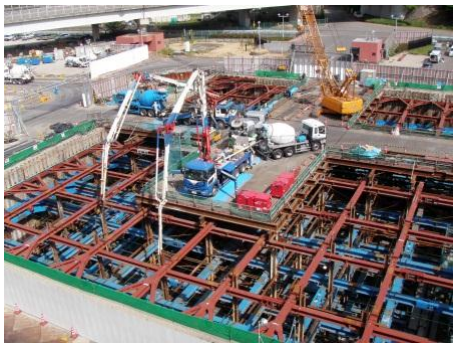

＜オゾン棟＞

オゾン棟は築造工事がほぼ終わり、建屋内の内装や照明・換気設備の設置を行っています。

＜オゾン接触池＞

オゾン接触池は、4 池の構造物の築造が終わり、下向管の設置についてもほぼ終了しました。

現在は、オゾン接触池と生物活性炭吸着池を繋ぐ連絡管を布設する工事を行っています。

＜生物活性炭吸着池＞

生物活性炭吸着池の築造は、洗浄水槽（左写真手前）を残すのみとなりました。

工事は、構造物の歩廊、手すりなどの内部の仕上げ工事が進んでいます。

＜場内連絡管の布設＞

場内連絡管の布設は、浄水場内の数カ所で並行して行っており、併せて連絡管と関係する弁室の築造も行っています。

稼働施設側の連絡管の布設では、過去の工事の残留物が出てくることもありますが、その都度適切に対応して布設工事を進めています。

＜電気設備・機械設備＞

電気・機械設備工事では、工場での機器製作が着々と進んでいます。

オゾン棟などが出来上がりつつありますので、そろそろ現場への機器搬入、据付が始まり、工事が本格化することとなります。

オゾン発生器

電動弁・手動弁

空気圧縮機

高度浄水施設建設　定点写真

・中間ポンプ施設（中央管理本館屋上から）

・オゾン処理施設・生物活性炭施設（高架水槽屋上から）
